

App de Apoyo y Orientación para Solicitantes de Visa

Tercer Sprint Scrum



Diego Quan (24336)

Diego Guevara (24128)

Juan Francisco Orozco Mijangos (24647)

Norman Aguirre (24479)

Enlaces importantes

Link con el repositorio donde está alojado el proyecto:

https://github.com/dquan123/Software_Proyecto.git

Link del Jira (De igual forma en la parte de abajo están las evidencias):

<https://uvg-team-somaxnik.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjojMDIyYzBjN2RiZGQyNGI1YzlmZDFmYzE1YWRjZTM3NjYiLCJwIjoiaj9>

Link del documento de trabajo:

https://1drv.ms/w/c/eb44c651f7b89612/IQAKN8TahxzpTla74Uoc8XRnAepFUqDmTG-8H5Y05ozP_A?e=oR58sJ

Link del sistema funcionando en un servidor (AWS):

<http://3.14.12.212:5173/>

Product Backlog

El Product Backlog del sistema está conformado por los requisitos funcionales definidos en la fase de análisis, los cuales representan las funcionalidades principales del sistema. Cada elemento del backlog está basado en una historia de usuario previamente identificada y cuenta con un nivel de prioridad según su impacto en el sistema.

Las funcionalidades incluidas en el Product Backlog son las siguientes:

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-41	Planificación del Sprint	Baja
RF-42	Implementación de Sidebar/Barra lateral	Alta
RF-43	Integración del Sidebar en todas las pantallas	Alta
RF-44	Implementación de Modo Senior (toggle)	Media
RF-45	Protección de rutas autenticadas	Alta
RF-46	Creación de tabla documentos en BD	Alta
RF-47	Implementación de endpoints para documentos	Alta
RF-48	Integración frontend-backend documentos	Alta
RF-49	Mejora de interfaz de documentos	Media
RF-50	Implementación de preview de documentos	Media
RF-51	Creación de pantalla Información	Alta
RF-52	Creación de pantalla Cronología	Alta
RF-53	Mejora de pantalla Perfil/Selección	Media
RF-54	Implementación de indicador de etapa actual	Media

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-55	Rediseño del Dashboard según Figma	Alta
RF-56	Implementación de cards de acceso rápido	Media
RF-57	Mejora visual del formulario DS-160	Media
RF-58	Implementación de estilos globales/tema	Baja
RF-59	Pruebas de integración completas	Alta
RF-60	Corrección de bugs encontrados	Alta
RF-61	Creación de reporte con métricas de Jira	Baja
RF-62	Presentación	Media

Las funcionalidades clasificadas con prioridad Alta corresponden a aquellas necesarias para garantizar el funcionamiento básico del sistema, especialmente las relacionadas con autenticación, simulación y guía del proceso de visa. Las funcionalidades de prioridad Media complementan la experiencia del usuario, mientras que las de prioridad Baja representan mejoras adicionales que pueden desarrollarse en futuros sprints.

Objetivos del Sprint

#	Objetivo	Métrica de Éxito	Responsable
1	Implementar sistema de navegación completo	100% de las pantallas protegidas tienen Sidebar funcional integrado	Diego Quan
2	Implementar accesibilidad con Modo Senior	Toggle funcional que aumenta tamaño de texto en al menos 5 pantallas	Diego Quan
3	Proteger todas las rutas autenticadas	100% de rutas protegidas redirigen a login si no hay sesión válida	Diego Quan
4	Completar módulo de documentos con persistencia	Documentos se guardan en BD con estados (pendiente, revisión, aprobado) y se pueden listar/subir	Norman Aguirre
5	Crear pantallas informativas del proceso	Pantallas de Información y Cronología funcionales con contenido del proceso de visa	Diego Guevara
6	Rediseñar Dashboard según prototipo Figma	Dashboard muestra progreso visual, etapa actual, siguiente acción y cards de acceso rápido	Juan Francisco
7	Realizar pruebas de integración completas	Flujo completo (registro → login → perfil → dashboard → documentos → DS-160) funciona sin errores	Norman Aguirre

Criterios de Aceptación del Sprint

1. **Navegación:** El usuario puede navegar entre todas las pantallas usando el Sidebar sin recargar la página manualmente.
2. **Modo Senior:** Al activar el toggle, el tamaño de texto aumenta visiblemente en títulos, párrafos y botones.
3. **Seguridad:** Un usuario sin sesión que intente acceder a /dashboard, /documents, /ds160, /perfil, /informacion o /cronologia es redirigido automáticamente a /login.
4. **Documentos:** El usuario puede subir un documento, ver la lista de sus documentos y ver el estado de cada uno.
5. **Dashboard:** El usuario ve su nombre, etapa actual del proceso (1-6), porcentaje de avance, y puede acceder rápidamente a documentos, cronología y simulador.
6. **Pruebas:** Se completa al menos un ciclo completo del flujo principal sin errores críticos.

Sprint Backlog

El Sprint Backlog está conformado por las historias de usuario seleccionadas para el desarrollo durante el sprint actual. Estas fueron elegidas con base en su prioridad y en el valor que aportan al sistema.

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Planificación del Sprint	Organización de tareas del sprint	2h	Diego Quan	23/04
Implementación de Sidebar/Barra lateral	Crear componente de navegación lateral persistente	4h	Diego Quan	25/04
Integración del Sidebar en todas las pantallas	Agregar el sidebar a Dashboard, DS-160, Documents y demás vistas	3h	Diego Quan	28/04
Implementación de Modo Senior (toggle)	Agregar switch para aumentar tamaño de texto en toda la app	2h	Diego Quan	30/04
Protección de rutas autenticadas	Implementar verificación de sesión en todas las rutas protegidas	3h	Diego Quan	02/05
Creación de tabla documentos en BD	Crear tabla para almacenar documentos subidos con estado y tipo	2h	Norman Aguirre	25/04
Implementación de endpoints para documentos	Crear GET/POST/PUT para guardar, listar y actualizar estado de documentos	3h	Norman Aguirre	28/04
Integración frontend-backend documentos	Conectar pantalla Documents con los endpoints del backend	3h	Norman Aguirre	30/04
Mejora de interfaz de documentos	Ajustar UI según diseño Figma	3h	Norman Aguirre	02/05

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Implementación de preview de documentos	Mostrar vista previa de PDFs e imágenes subidas	2h	Norman Aguirre	05/05
Creación de pantalla Información	Página con info del proceso de visa	4h	Diego Guevara	25/04
Creación de pantalla Cronología	Timeline visual con las 6 etapas del proceso	4h	Diego Guevara	30/04
Mejora de pantalla Perfil/Selección	Ajustar diseño según Figma y mejorar UX	2h	Diego Guevara	02/05
Implementación de indicador de etapa actual	Mostrar visualmente en qué etapa está el usuario	2h	Diego Guevara	05/05
Rediseño del Dashboard según Figma	Implementar layout completo del dashboard	4h	Juan Francisco	25/04
Implementación de cards de acceso rápido	Cards para Documentos, Cronología, Simulador	3h	Juan Francisco	30/04
Mejora visual del formulario DS-160	Ajustes de estilos y responsive	2h	Juan Francisco	02/05
Implementación de estilos globales/tema	Crear archivo de estilos compartidos	2h	Juan Francisco	05/05
Pruebas de integración completas	Testing de flujos completos	3h	Norman Aguirre	06/05
Corrección de bugs encontrados	Arreglo de errores detectados en testing	2h	Diego Guevara	06/05
Creación de reporte con métricas de Jira	Generar métricas del sprint	2h	Diego Quan	06/05
Presentación	Preparación y repartición de temas para exposición	3h	Juan Francisco	06/05

Evidencia del flujo en Jira

Escacio

Visa Advisory

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Informes

Accesos rápidos

Calendario

Desarrollo

Buscar en...

Filtro

SCRUM Sprint 3

22 abr – 6 may (22 actividades)

251570

Completar sprint

SCRUM-49	Planificación del Sprint	FINALIZADA	23 abr	5	
SCRUM-70	Protección de rutas autenticadas	FINALIZADA	2 may	5	
SCRUM-52	Implementación de Modo Senior (toggle)	FINALIZADA	30 abr	5	
SCRUM-62	Rediseño del Dashboard según Figma	FINALIZADA	25 abr	5	
SCRUM-51	Integración del Sidebar en todas las pantallas	FINALIZADA	28 abr	5	
SCRUM-50	Implementación de Sidebar/Barra lateral	FINALIZADA	25 abr	5	
SCRUM-57	Implementación de preview de documentos	FINALIZADA	5 may	5	
SCRUM-53	Creación de tabla documentos en BD	FINALIZADA	25 abr	5	

Escacio

Visa Advisory

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Informes

Accesos rápidos

Calendario

Desarrollo

13 finalizadas

en los últimos 7 días

16 actualizadas

en los últimos 7 días

0 creadas

en los últimos 7 días

6 vencen pronto

en los próximos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades. Ver todas las actividades

27

Actividades en ...

Done: 19

In Progress: 3

To Do: 5

Espacio

 **Visa Advisory**  ...



 Resumen  Backlog  **Tablero**  Código  Informes  Accesos rápidos  Calendario  Desarrollo 

      Filtro

Completar sprint

 Grupo   ...

TO DO 5	IN PROGRESS 3	IN REVIEW	DONE 14
Implementación de estilos globales/tema  5 may 2026 ☒ SCRUM-65 5 = JM	Mejora de pantalla Perfil/Selección  2 may 2026 ☒ SCRUM-60 5 = DC		Planificación del Sprint  23 abr 2026 ☒ SCRUM-49  5 = 6
Pruebas de integración completas  6 may 2026 ☒ SCRUM-66 5 = NL	Mejora visual del formulario DS-160  2 may 2026 ☒ SCRUM-64 5 = JM		Protección de rutas autenticadas  2 may 2026 ☒ SCRUM-76  5 = 6
Corrección de bugs	Implementación de indicador		Implementación de Modo Senior (toggle)  25 abr 2026 ☒ SCRUM-77  5 = 6

Espacio

 **Visa Advisory**  ...



 Resumen  Backlog  **Tablero**  Código  Informes  Accesos rápidos  Calendario  Desarrollo 

     Filtro

Completar sprint

 Grupo   ...

TO DO 3	IN PROGRESS 4	IN REVIEW	DONE 15
☒ SCRUM-67 5 = DC	☒ SCRUM-61 5 = DC		☒ SCRUM-79  5 = 6
Creación de reporte con métricas de Jira  6 may 2026 ☒ SCRUM-68 5 = DC	Implementación de estilos globales/tema  5 may 2026 ☒ SCRUM-65 5 = JM		Implementación de Modo Senior (toggle)  30 abr 2026 ☒ SCRUM-52  5 = 6
+ Crear	Presentación  6 may 2026 ☒ SCRUM-69 5 = JM		Rediseño del Dashboard según Figma  25 abr 2026 ☒ SCRUM-78  5 = 6

Espacio

Visa Advisory

...

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Informes

Accesos rápidos

Calendario

Desarrollo

Buscar ta...

...

Filtro

Completar sprint

Grupo

...

TO DO 2

Pruebas de integración completas

6 may 2026

SCRUM-66 5

Creación de reporte con métricas de Jira

6 may 2026

SCRUM-68 5

+ Crear

IN PROGRESS

IN REVIEW

DONE 20

Planificación del Sprint

23 abr 2026


SCRUM-49 5

Presentación

6 may 2026

SCRUM-69 5

Protección autentic



Completar SCRUM Sprint 3

Este sprint contiene 22 actividades en estado completado.
Ya está todo listo. ¡Bien hecho!



Crear una retrospectiva para este sprint

Termina tu sprint con una retrospectiva de Confluence. Contribuye con la cultura de tu equipo y mejora tu forma de trabajar.



Genera un resumen de sprint con Roov

Usa Roov para crear un resumen listo para ejecutivos de este sprint, incluidos logros clave, impedimentos y recomendaciones.

Cancelar

Terminar sprint

✓ 10 finalizadas
en los últimos 7 días

✎ 33 actualizadas
en los últimos 7 días

📝 23 creadas
en los últimos 7 días

📅 0 vencen pronto
en los próximos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades. [Ver todas las actividades](#)



■ Done: 21
■ To Do: 23



Puntos del sprint

Durante la planificación del sprint se estimaron las tareas utilizando puntos de historia con base en su complejidad relativa. Las tareas del sprint abarcaron múltiples áreas del sistema, incluyendo la implementación del Sidebar y su integración en todas las pantallas, el modo Senior (toggle), la gestión de documentos con tabla en base de datos, endpoints e integración frontend-backend, preview y mejora de interfaz de documentos, la creación de nuevas pantallas (Información, Cronología, Perfil/Selección mejorada), indicador de etapa actual, cards de acceso rápido, rediseño del Dashboard según Figma, mejora visual del formulario DS-160, estilos globales/tema, protección de rutas autenticadas, corrección de bugs, pruebas de integración completas, el reporte de métricas de Jira y la presentación.

A partir de esta estimación, el sprint tuvo un total de 110 puntos de historia.

Al finalizar el sprint, el equipo logró completar la totalidad de las tareas planificadas, alcanzando los 110 puntos de historia completados, lo que indica un cumplimiento total del alcance definido para el sprint.

Uso de Jira

Durante el desarrollo del sprint se utilizó Jira como herramienta de gestión para organizar y dar seguimiento a las 22 tareas del equipo (SCRUM-49 a SCRUM-70).


El sprint fue iniciado el 23 de abril de 2026 y finalizado el 11 de mayo de 2026, respetando el calendario establecido para el proyecto. Las tareas fueron definidas en la reunión de planificación y todas fueron añadidas el primer día del sprint (23 de abril), sin incorporarse tareas nuevas posteriormente, lo que evidencia una planificación concentrada en el inicio y sin modificación del alcance una vez en curso.

A lo largo del sprint se mantuvo un flujo de trabajo dentro del tablero, donde las tareas avanzaron progresivamente por los estados correspondientes, reflejando el progreso real del equipo.

Existe coherencia entre las tareas marcadas como completadas en Jira y el incremento del sistema presentado, ya que las funcionalidades implementadas (Sidebar, modo Senior, gestión de documentos, nuevas pantallas, rediseño del Dashboard, mejoras al formulario DS-160 y protección de rutas) pueden observarse funcionando en el sistema.

Burndown

El gráfico burndown muestra la evolución del trabajo pendiente durante el sprint. Al inicio del sprint se registraron 110 puntos de historia (correspondientes a las 22 tareas añadidas el 23 de abril), los cuales fueron disminuyendo conforme se completaban las tareas a lo largo del sprint.

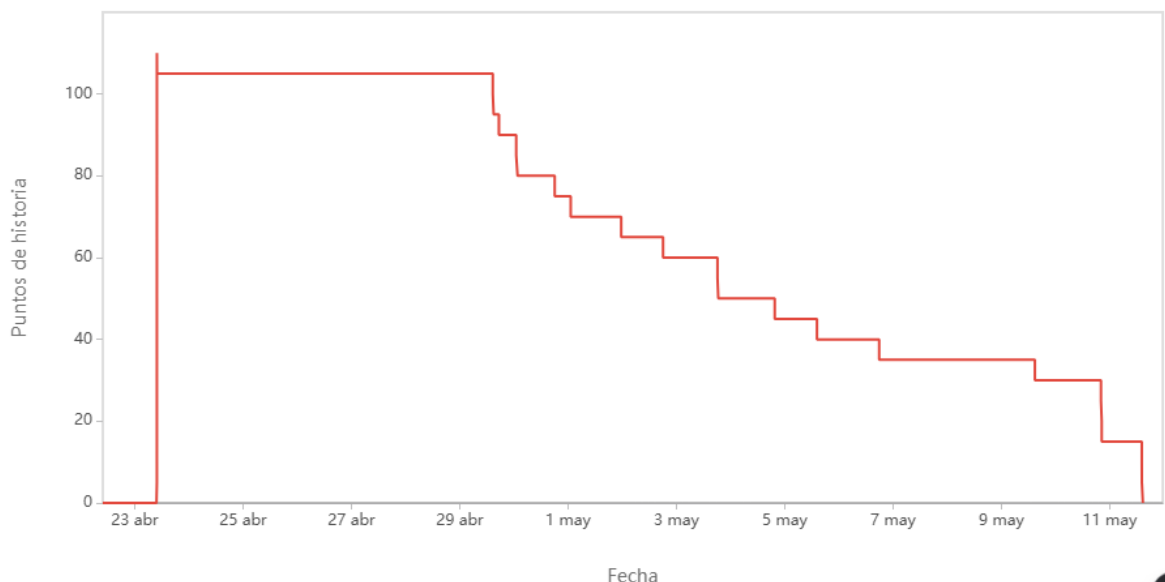

Interpretación:

El gráfico burndown evidencia que el trabajo no se realizó de manera uniforme. Durante los primeros días (23–28 de abril) el progreso fue prácticamente nulo, manteniéndose el trabajo pendiente en 105 puntos sin reducciones significativas. La primera caída relevante ocurrió el 29 de abril con el inicio de las primeras tareas completadas, y a partir del 30 de abril el equipo comenzó a mantener un ritmo más constante, con avances diarios los días 30 de abril, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 de mayo.

Los últimos descensos importantes ocurrieron el 10 y 11 de mayo, cerrando el sprint con 0 puntos pendientes el día final.


Este comportamiento refleja una concentración del trabajo en la segunda mitad del periodo, más pronunciada que en el sprint anterior, aunque el equipo logró completar la totalidad del alcance comprometido.

Velocidad del sprint

La velocidad del sprint corresponde a la cantidad de puntos de historia completados durante el periodo. En este sprint, el equipo logró completar 110 puntos de historia, superando incluso el total comprometido en el Sprint 2.

Este resultado representa un incremento adicional respecto al Sprint 2 (donde se completaron 105 puntos), consolidando la tendencia de crecimiento en la capacidad de entrega del equipo. El promedio de velocidad acumulado entre los tres sprints es de 77 puntos, según el informe de velocidad de Jira (Sprint 1: 16 pts, Sprint 2: 105 pts, Sprint 3: 110 pts).

La velocidad obtenida en este sprint proporciona una referencia sólida para la planificación de futuros sprints, considerando que se logró el 100% del alcance comprometido y se superó el volumen del sprint anterior.

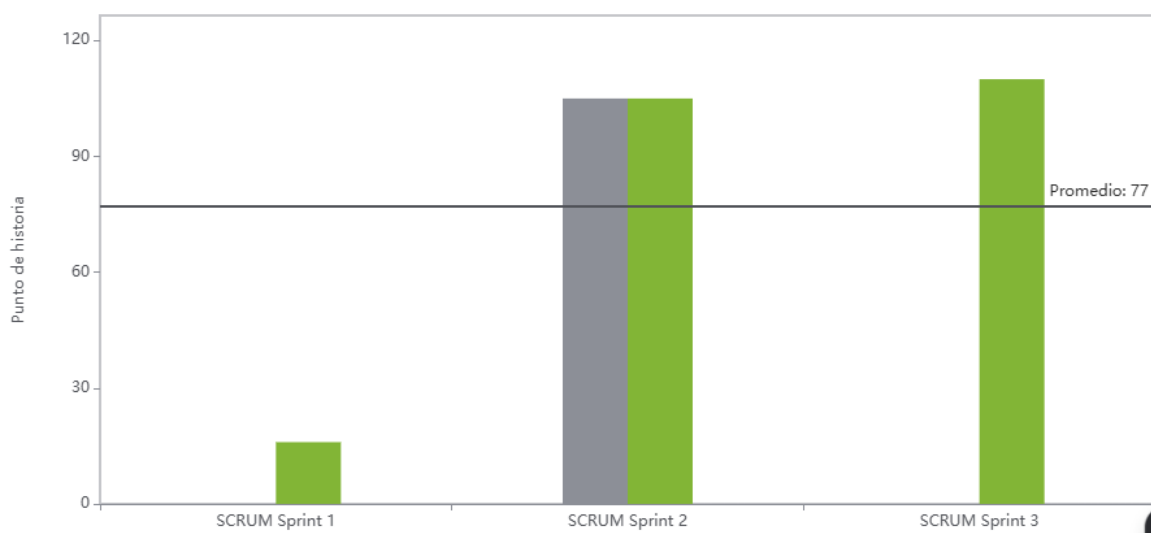

Indicador numérico del éxito del sprint

Indicador Numérico del Éxito del Sprint (ISE)

Duración: 23 de abril – 11 de mayo 2026 (19 días)

Puntos comprometidos: 110

Puntos completados: 110

Tareas totales: 22 tareas (5 pts c/u)

Cambios de alcance: 0

Tareas reabiertas: 0

Fórmula

$$\text{ISE} = (\text{Tasa de Entrega} \times 0.60) + (\text{Tasa de Estabilidad} \times 0.25) + (\text{Índice de Ritmo} \times 0.15)$$

Tasa de Entrega (60%): $\text{Pts completados} / \text{Pts comprometidos} = 110/110 = 1.00$

Tasa de Estabilidad (25%): $1 - (\text{cambios} + \text{retrabajos}) / \text{total tareas} = 1 - (0/22) = 1.00$

Índice de Ritmo (15%): $\text{Pts primera mitad} / (\text{Pts totales} / 2)$, máx. 1.0. Durante la primera mitad del sprint (23 abr – 1 may, ~9–10 días) se completaron aproximadamente 15 puntos de los 110 totales, frente a los 55 esperados. $= 15/55 = 0.273 \rightarrow \text{cap. a } 1.0 \rightarrow 0.273$

$$\text{ISE} = (1.00 \times 0.60) + (1.00 \times 0.25) + (0.273 \times 0.15) = 0.600 + 0.250 + 0.041 = 0.891 \rightarrow \mathbf{89.1\%}$$

Escala de interpretación

90% – 100%: Excelente

75% – 89%: Bueno

60% – 74%: Aceptable

< 60%: Crítico

El Sprint 3 obtuvo 89.1% (Bueno). Se entregó el 100% del compromiso sin cambios de alcance y sin tareas reabiertas. La penalización se debe exclusivamente a que el trabajo se concentró de manera muy marcada en la segunda mitad del sprint, con una primera semana prácticamente sin actividad registrada, lo que redujo considerablemente el Índice de Ritmo.

Retrospectiva

Aspectos positivos

Durante el sprint se lograron avances muy significativos en el sistema, incluyendo la implementación del Sidebar y su integración transversal en todas las pantallas, el modo Senior, la gestión completa de documentos (tabla en BD, endpoints, integración frontend-backend, preview y mejora visual), la creación de nuevas pantallas (Información, Cronología, Perfil/Selección mejorada), el rediseño del Dashboard según Figma, las mejoras visuales al formulario DS-160, los estilos globales, la protección de rutas autenticadas y las pruebas de integración. El equipo completó la totalidad de los 110 puntos de historia planificados, lo que supera el volumen entregado en el Sprint 2 y demuestra una capacidad de entrega sostenida y en crecimiento.

Además, no se registraron cambios de alcance durante el sprint ni tareas reabiertas, lo que indica que la planificación inicial fue sólida y que los criterios de aceptación se cumplieron correctamente desde el primer intento, corrigiendo la debilidad identificada en el sprint anterior.

Aspectos a mejorar

Se identificó nuevamente, y de forma más pronunciada que en sprints anteriores, que el inicio del desarrollo se concentró principalmente en la segunda mitad del sprint, con una actividad prácticamente nula durante los primeros seis días (23–28 de abril). Aunque el equipo logró completar todo el alcance, esta concentración extrema hacia el final genera una presión innecesaria, reduce el margen para detectar y corregir errores, y limita significativamente el índice de ritmo del sprint.

Este patrón recurrente representa la principal área de mejora del equipo, ya que, si bien la capacidad de entrega es alta, la distribución temporal del trabajo no refleja una constancia sostenida a lo largo del periodo.

Acciones a tomar

Para futuros sprints, se propone establecer compromisos internos con metas de entrega intermedias obligatorias: al menos el 40–50% de los puntos deben estar completados al llegar al punto medio del sprint. Se recomienda implementar revisiones de progreso al finalizar cada semana (por ejemplo, cada viernes) para identificar bloqueos y redistribuir el trabajo si es necesario.

Se sugiere también que durante la planificación se asignen explícitamente las tareas a los primeros días del sprint, evitando que queden sin responsable hasta la segunda semana. Por último, se propone usar la velocidad real de 110 puntos como referencia para calibrar la estimación del próximo sprint, manteniendo un volumen similar o levemente superior, pero priorizando una distribución más distribuida del esfuerzo a lo largo de todo el periodo.

Anexos

Formularios LOGT

Nombre: Diego Quan						
Carné: 24336						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
23/04	19:00	21:00	-	120 min	Backlog	Planificación del Sprint y definición de tareas
25/04	18:00	22:00	15 min	225 min	Desarrollo	Implementación de Sidebar/Barra lateral
28/04	19:00	22:00	10 min	170 min	Desarrollo	Integración del Sidebar en todas las pantallas
29/04	18:00	20:30	10 min	140 min	Desarrollo	Configuración de servidor AWS y variables de entorno
30/04	19:00	21:00	10 min	110 min	Desarrollo	Implementación de Modo Senior (toggle)
02/05	18:00	21:00	15 min	165 min	Desarrollo	Protección de rutas autenticadas con useRequireAuth

05/05	19:00	23:00	15 min	225 min	Desarrollo	Rediseño del Dashboard según Figma (timeline, animaciones, cards)
11/05	11:00	23:00	10 min	110 min	Cierre	Creación de reporte con métricas de Jira

Nombre: Norman Aguirre						
Carné: 24479						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
29/04	20:00	23:00	20 min	160 min	Desarrollo	Adición de variables de entorno y creación de .env en el servidor
30/04	00:00	01:30	-	90 min	Desarrollo	Adición de endpoint para Documentos y tabla para referenciar documentos.
30/04	22:00	23:59	-	119 min	Desarrollo	Cambio de credenciales en Docker File
01/05	00:00	00:30	-	30 min	Desarrollo	Arreglo del archivo .env en el servidor.

01/05	00:30	02:00	-	90 min	Desarrollo	Integración a R2 y fixear errores en el EndPoint.
01/05	15:00	18:00	180 mins (fui a comer)	60 min	Desarrollo	Cambios a la UI de documentos
09/05	15:00	18:00	30 mins (me llamarón)	150 min	Desarrollo	Nueva pantalla de documentos y slide bar
09/05	19:00	20:00	-	60 min	Desarrollo	Adición preview de documentos y cambios en la pantalla.

Nombre: Diego Guevara						
Carné: 24128						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
08/05	18:00	19:15	5 min	70 min	UI	Mejora de la pantalla de perfil para adaptarla al diseño propuesto en Figma.
08/05	19:20	20:30	10 min	60 min	BD	Integración de la pantalla de perfil con la base de datos para mostrar información real del usuario.

09/05	16:00	17:10	0 min	70 mi	UI	Implementación de la pantalla de información del trámite dentro de la aplicación.
09/05	17:20	18:40	10 min	70 min	Funcionalidad	Desarrollo de la pantalla de cronología para visualizar el avance del trámite del usuario.
10/05	15:30	16:40	5 min	65 min	Revision	Revisión de navegación entre pantallas y validación de conexión con los datos del sistema.

Nombre: Juan Francisco Orozco Mijangos						
Carné: 24647						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios

27/04	19:00	20:30	10 min	80 min	Planificación	Revisión del repositorio del proyecto, estructura de carpetas y archivos existentes.
28/04	18:00	19:30	5 min	85 min	Desarrollo / UI	Análisis del prototipo en Figma e identificación de diferencias con la implementación actual.

29/04	20:00	21:30	0 min	90 min	Desarrollo / UI	Inicio del rediseño del Dashboard según el prototipo de Figma.
01/05	17:00	18:30	10 min	80 min	Desarrollo / UI	Implementación de la card de progreso general con timeline horizontal y nodos.
02/05	19:00	20:30	5 min	85 min	Desarrollo / UI	Implementación de la caja navy "Etapa Actual" con anillo de progreso circular.
03/05	18:00	19:30	0 min	90 min	Desarrollo / UI	Rediseño de la action card con borde rojo izquierdo según Figma.
05/05	19:00	20:30	10 min	80 min	Desarrollo / UI	Implementación de las 3 cards de acceso rápido (documentos, cronología, simulador).
07/05	18:00	19:30	5 min	85 min	Desarrollo / UI	Mejora visual del formulario DS-160: checkmarks SVG, íconos de info y disquete.
08/05	19:00	20:30	0 min	90 min	Desarrollo / Tema	Implementación de estilos globales y variables CSS del tema VisaGuide en index.css.
09/05	16:00	17:30	15 min	75 min	Integración	Resolución de conflictos de CORS con Express 5 y Node 25, fix del backend.
10/05	18:00	19:30	10 min	80 min	Integración	Commits y push de todos los cambios al repositorio, resolución de conflictos de merge.
11/05	10:00	11:00	0 min	60 min	Revisión	Pruebas finales del proyecto en local, verificación de todas las pantallas.
