

App de Apoyo y Orientación para Solicitantes de Visa

Segundo Sprint Scrum



Diego Quan (24336)

Diego Guevara (24128)

Juan Francisco Orozco Mijangos (24647)

Norman Aguirre (24479)

Enlaces importantes

Link con el repositorio donde está alojado el proyecto:

https://github.com/dquan123/Software_Proyecto.git

Link del Jira (De igual forma en la parte de abajo están las evidencias):

<https://uvg-team-somaxnik.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjojMDIyYzBjN2RiZGQyNGI1YzlmZDFmYzE1YWRjZTM3NjYiLCJwIjoiaj9>

Link del documento de trabajo:

https://1drv.ms/w/c/eb44c651f7b89612/IQCqHsUTwU6LT6CWc23_SlF0AR_hj55_fdwtD0TarThK_xY?e=b9ccfY

Link del sistema funcionando en un servidor (AWS):

<http://3.14.12.212:5173/>

Product Backlog

El Product Backlog del sistema está conformado por los requisitos funcionales definidos en la fase de análisis, los cuales representan las funcionalidades principales del sistema. Cada elemento del backlog está basado en una historia de usuario previamente identificada y cuenta con un nivel de prioridad según su impacto en el sistema.

Las funcionalidades incluidas en el Product Backlog son las siguientes:

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-19	Implementación de estado simple del trámite	Alta
RF-20	Definición de estructura básica del formulario	Alta
RF-21	Manejo de errores con mensajes claros	Alta
RF-22	Ajuste visual básico alineado al diseño	Media
RF-23	Planificación del Sprint	Baja
RF-24	Implementar validación básica de correo y contraseña	Alta
RF-25	Integración frontend-backend (Login)	Alta
RF-26	Manejo básico de errores de autenticación	Alta
RF-27	Ajuste de interfaz de usuario (Login)	Media
RF-28	Implementación de persistencia de sesión	Alta
RF-29	Corrección de guardado del perfil en backend	Alta
RF-30	Implementación de visualización de documentos	Alta
RF-31	Implementación de feedback visual	Media

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-32	Mejora básica de interfaz (Dashboard)	Media
RF-33	Mejora básica de interfaz (Documentos)	Media
RF-34	Desarrollo de interfaz del formulario en React	Alta
RF-35	Integración frontend-backend (Asistente)	Alta
RF-36	Navegación básica entre pasos (Asistente)	Alta
RF-37	Implementación de endpoints para guardar información	Alta
RF-38	Pruebas completas del programa completo	Alta
RF-39	Creación de reporte con métricas de Jira	Baja
RF-40	Presentación	Media

Las funcionalidades clasificadas con prioridad Alta corresponden a aquellas necesarias para garantizar el funcionamiento básico del sistema, especialmente las relacionadas con autenticación, simulación y guía del proceso de visa. Las funcionalidades de prioridad Media complementan la experiencia del usuario, mientras que las de prioridad Baja representan mejoras adicionales que pueden desarrollarse en futuros sprints.

Sprint Backlog

El Sprint Backlog está conformado por las historias de usuario seleccionadas para el desarrollo durante el sprint actual. Estas fueron elegidas con base en su prioridad y en el valor que aportan al sistema.

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Planificación del Sprint	Organización de tareas del sprint	2h	Norman Aguirre	08/04
Manejo de errores con mensajes claros	Mostrar errores comprensibles al usuario	2h	Norman Aguirre	10/04
Ajuste visual básico alineado al diseño	Mejoras visuales según diseño	2h	Juan Francisco	10/04
Implementar validación básica de correo y contraseña	Validaciones simples en formulario	2h	Norman Aguirre	10/04
Integración frontend-backend (Login)	Conectar login con backend	3h	Diego Guevara	11/04
Manejo básico de errores de autenticación	Control de errores en login	2h	Diego Quan	11/04
Ajuste de interfaz de usuario (Login)	Mejoras UI en pantalla login	2h	Diego Guevara	11/04
Implementación de persistencia de sesión	Mantener sesión del usuario activa	3h	Diego Quan	11/04
Corrección de guardado del perfil en backend	Arreglo de guardado de datos	2h	Norman Aguirre	14/04
Implementación de feedback visual	Indicadores visuales de acciones	2h	Juan Francisco	14/04

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Implementación de estado simple del trámite	Lógica básica para mostrar estado del trámite	3h	Diego Quan	15/04
Mejora básica de interfaz (Dashboard)	Ajustes UI del dashboard	2h	Diego Guevara	15/04
Implementación de visualización de documentos	Mostrar documentos al usuario	3h	Norman Aguirre	17/04
Mejora básica de interfaz (Documentos)	Ajustes UI en documentos	2h	Juan Francisco	17/04
Navegación básica entre pasos (Asistente)	Flujo entre pantallas del asistente	2h	Diego Guevara	20/04
Definición de estructura básica del formulario	Estructura inicial del formulario	3h	Diego Quan	21/04
Desarrollo de interfaz del formulario en React	Crear UI del formulario	4h	Juan Francisco	21/04
Integración frontend-backend (Asistente)	Conectar asistente con backend	3h	Diego Guevara	21/04
Implementación de endpoints para guardar información	Crear endpoints backend	3h	Diego Quan	21/04
Pruebas completas del programa completo	Testing general del sistema	4h	Norman Aguirre	21/04
Creación de reporte con métricas de Jira	Generar métricas del sprint	2h	Diego Quan	22/04
Presentación	Preparación y repartición de temas en exposición	3h	Juan Francisco	22/04

Evidencia del flujo en Jira

Espacio

Visa Advisory

ResumenBacklogTableroCódigoInformesAccesos rápidosCalendario

Buscar en... Filtro

SCRUM-36	Implementación de feedback visual (HU-03 - ...	FINALIZADA	14 abr	5	JM
SCRUM-42	Implementación de endpoints para guardar inf...	EN REVISIÓN	21 abr	5	NL
SCRUM-38	Mejora básica de interfaz (HU-04 - Dashboard)	FINALIZADA	15 abr	5	DC
SCRUM-40	Mejora básica de interfaz (HU-09 - Document...	EN CURSO	17 abr	5	JM
SCRUM-41	Definición de estructura básica del formulario (...)	EN CURSO	21 abr	5	DC
SCRUM-43	Desarrollo de interfaz del formulario en React (...)	EN CURSO	21 abr	5	JM
SCRUM-44	Integración frontend-backend (HU-06 - Asiste...	EN CURSO	21 abr	5	DC
SCRUM-45	Navegación básica entre pasos (HU-06 - Asist...	EN CURSO	20 abr	5	DC
SCRUM-46	Pruebas completas del programa completo	TAREAS POR HACER	21 abr	5	NL

Espacio

Visa Advisory

ResumenBacklogTableroCódigoInformesAccesos rápidosCalendario

11 finalizadas
en los últimos 7 días

17 actualizadas
en los últimos 7 días

0 creadas
en los últimos 7 días

8 vencen pronto
en los próximos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades. [Ver todas las actividades](#)

46

Actividades en ...

Done: 37

In Progress: 6

In Review: 1

To Do: 2

Espacio

Visa Advisory



Resumen Backlog Tablero Código Informes Accesos rápidos Calendario

Buscar ta... Filtro

Completar sprint Grupo

TO DO 2

Pruebas completas del programa completo
21 abr 2026
SCRUM-46 5 NL

Creación de Reporte con métricas de Jira
22 abr 2026
SCRUM-47 5

+ Crear

IN PROGRESS 6

Mejora básica de interfaz (HU-09 - Documentos)
17 abr 2026
SCRUM-40 5 JM

Definición de estructura básica del formulario (HU-06 - Asistente DS-160)
21 abr 2026
SCRUM-41 5

IN REVIEW 1

Implementación de endpoints para guardar información (HU-06 - Asistente DS-160)
21 abr 2026
SCRUM-42 5 NL

DONE 13

Implementación de estado simple del trámite (HU-04 - Dashboard)
15 abr 2026
SCRUM-37 5

Manejo de errores con mensajes claros (Registros)
10 abr 2026
SCRUM-38 5

Espacio

Visa Advisory



Resumen Backlog Tablero Código Informes Accesos rápidos Calendario

Buscar ta... Filtro

Completar sprint Grupo

TO DO 3

Implementación de endpoints para guardar información (HU-06 - Asistente DS-160)
21 abr 2026
SCRUM-42 5

Pruebas completas del programa completo
21 abr 2026
SCRUM-46 5 NL

IN PROGRESS 4

Desarrollo de interfaz del formulario en React (HU-06 - Asistente DS-160)
21 abr 2026
SCRUM-43 5 JM

Integración frontend-backend (HU-06 - Asistente DS-160)
21 abr 2026
SCRUM-44 5 DC

IN REVIEW

DONE 15

Implementación de estado simple del trámite (HU-04 - Dashboard)
15 abr 2026
SCRUM-37 5

Definición de estructura básica del formulario (HU-06 - Asistente DS-160)
21 abr 2026
SCRUM-41 5



Completar SCRUM Sprint 2

Este sprint contiene 22 actividades en estado completado.
Ya está todo listo. ¡Bien hecho!



Crear una retrospectiva para este sprint

Termina tu sprint con una retrospectiva de Confluence. Contribuye con la cultura de tu equipo y mejora tu forma de trabajar.



Genera un resumen de sprint con Rovo

Usa Rovo para crear un resumen listo para ejecutivos de este sprint, incluidos logros clave, impedimentos y recomendaciones.

Cancelar

Terminar sprint



15 finalizadas

en los últimos 7 días



15 actualizadas

en los últimos 7 días



0 creadas

en los últimos 7 días



0 vencen pronto

en los próximos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades. [Ver todas las actividades](#)



■ Done: 30



Puntos del sprint

Durante la planificación del sprint se estimaron las tareas utilizando puntos de historia con base en su complejidad relativa. Las tareas del sprint abarcaron múltiples historias de usuario, incluyendo mejoras al registro de usuarios, autenticación y persistencia de sesión, selección de perfil, dashboard de trámites, visualización de documentos, el asistente del formulario DS-160 (con definición de estructura, endpoints, interfaz en React, integración y navegación entre pasos), pruebas integrales del sistema y la elaboración del reporte y presentación.

A partir de esta estimación, el sprint tuvo un total de 105 puntos de historia.

Al finalizar el sprint, el equipo logró completar la totalidad de las tareas planificadas, alcanzando los 105 puntos de historia completados, lo que indica un cumplimiento total del alcance definido para el sprint.

Uso de Jira

Durante el desarrollo del sprint se utilizó Jira como herramienta de gestión para organizar y dar seguimiento a las 22 tareas del equipo (SCRUM-27 a SCRUM-48).


El sprint fue iniciado el 9 de abril de 2026 y finalizado el 22 de abril de 2026, respetando el calendario establecido para el proyecto. Las tareas fueron definidas en la reunión de planificación y no se añadieron tareas nuevas una vez iniciado el sprint, evidenciando una buena planificación previa y sin modificación del alcance.

A lo largo del sprint se mantuvo un flujo de trabajo consistente dentro del tablero, donde las tareas avanzaron progresivamente por los estados correspondientes, reflejando el progreso real del equipo.

Existe coherencia entre las tareas marcadas como completadas en Jira y el incremento del sistema presentado, ya que las funcionalidades implementadas (mejoras al login, registro, dashboard, documentos y el asistente DS-160) pueden observarse funcionando en el sistema y en las capturas del producto.

Burndown

El gráfico burndown muestra la evolución del trabajo pendiente durante el sprint. Al inicio del sprint se estimó un total de 105 puntos de historia, los cuales fueron disminuyendo conforme se completaban las tareas a lo largo del sprint.

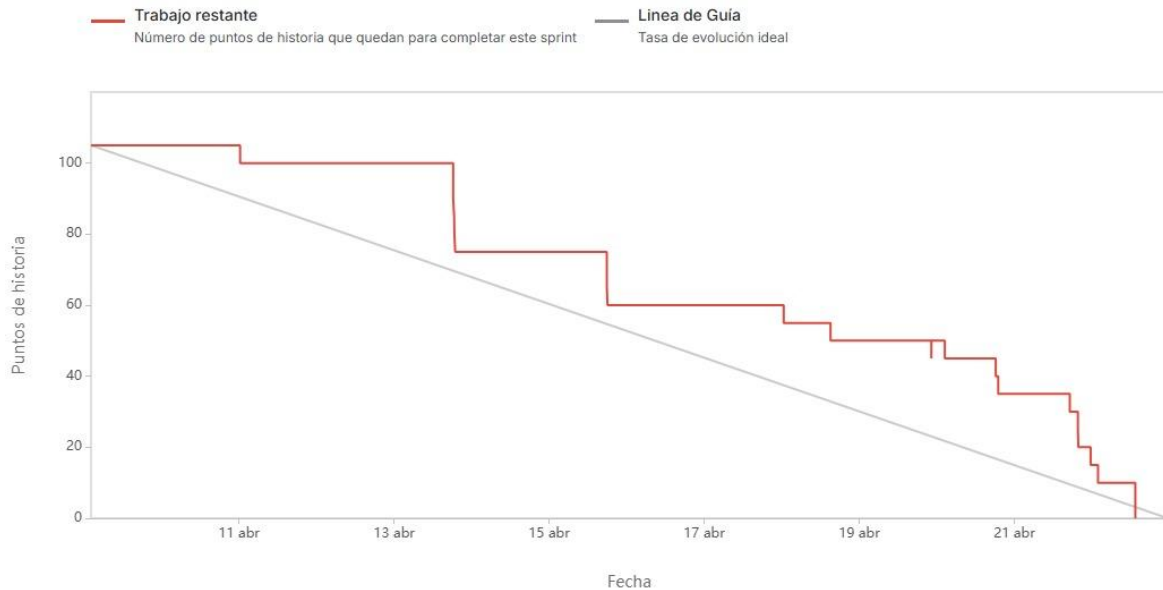

Interpretación:

El gráfico burndown evidencia que el trabajo tampoco se realizó de manera completamente uniforme. Durante los primeros días (9–12 de abril) el progreso fue mínimo, y la primera reducción significativa ocurrió el 13 de abril con la finalización de varias tareas de Login y Registros. A partir del 15 de abril el equipo mantuvo un ritmo más constante, con avances notables los días 18, 19, 20 y 21 de abril, donde se completaron las tareas del Dashboard, Documentos y el Asistente DS-160.

La última caída ocurrió el 22 de abril con la realización de la integración frontend-backend del DS-160, el reporte y la presentación, cerrando el sprint con 0 puntos pendientes.


Este comportamiento refleja una distribución más equilibrada que en el sprint anterior, aunque todavía con cierta concentración de trabajo hacia la segunda mitad del periodo.

Velocidad del sprint

La velocidad del sprint corresponde a la cantidad de puntos de historia completados durante el periodo. En este sprint, el equipo logró completar 105 puntos de historia, coincidiendo exactamente con el total estimado al inicio.

Este resultado representa un incremento considerable respecto al Sprint 1 (donde se completaron 16 puntos), lo que refleja una mayor madurez del equipo en cuanto a estimación y ejecución. El promedio de velocidad acumulado entre ambos sprints es de 60.5 puntos, según el informe de velocidad de Jira.

La velocidad obtenida en este sprint proporciona una referencia sólida para la planificación de futuros sprints, considerando que se logró el 100% del alcance comprometido.

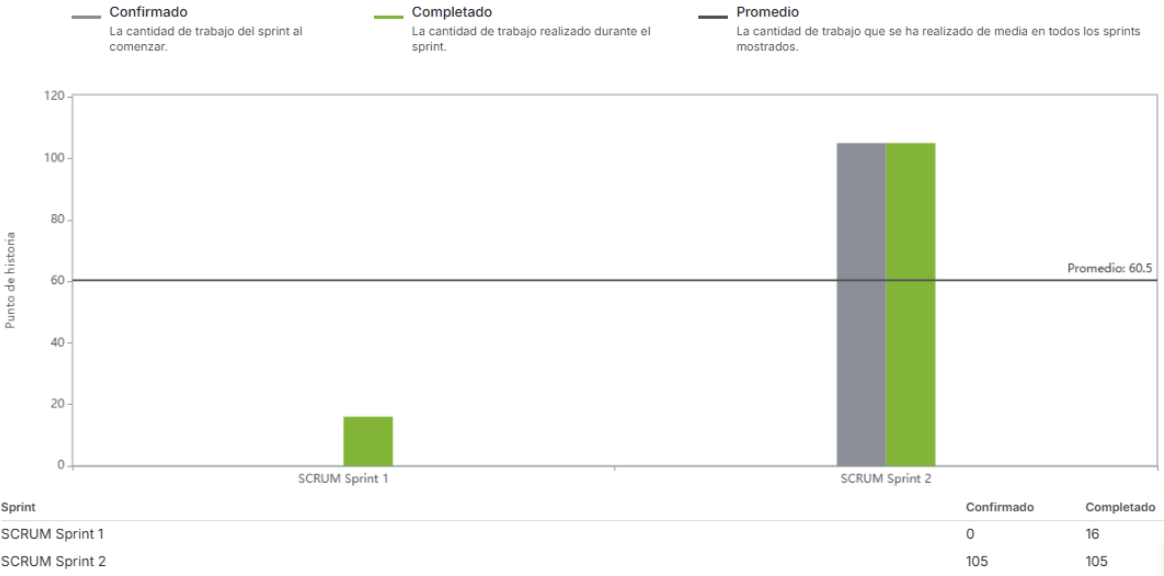

Indicador numérico del éxito del sprint

Indicador Numérico del Éxito del Sprint (ISE)

Duración: 9 – 22 de abril 2026 (14 días)

Puntos comprometidos: 105

Puntos completados: 105

Tareas totales: 21 tareas (5 pts c/u)

Cambios de alcance: 0

Tareas reabiertas: 1 (SCRUM-42)

Fórmula

$$\text{ISE} = (\text{Tasa de Entrega} \times 0.60) + (\text{Tasa de Estabilidad} \times 0.25) + (\text{Índice de Ritmo} \times 0.15)$$

Tasa de Entrega (60%): $\text{Pts completados} / \text{Pts comprometidos} = 105/105 = 1.00$

Tasa de Estabilidad (25%): $1 - (\text{cambios} + \text{retrabajos}) / \text{total tareas} = 1 - (1/21) = 0.952$

Índice de Ritmo (15%): $\text{Pts primera mitad} / (\text{Pts totales} / 2), \text{máx. } 1.0 = 45/52.5 = 0.857$

$$\text{ISE} = (1.00 \times 0.60) + (0.952 \times 0.25) + (0.857 \times 0.15) = 0.967 \rightarrow \mathbf{96.7\%}$$

Escala de interpretación

90% – 100%: Excelente

75% – 89%: Bueno

60% – 74%: Aceptable

< 60%: Crítico

El Sprint 2 obtuvo 96.7% (Excelente). Se entregó el 100% del compromiso sin cambios de alcance. La pequeña penalización se debe a la tarea SCRUM-42 que fue reabierta, y a que el trabajo se concentró levemente en los últimos días del sprint.

Retrospectiva

Aspectos positivos

Durante el sprint se lograron avances muy significativos en el sistema, incluyendo la mejora de funcionalidades existentes (registro, login, selección de perfil) y el desarrollo de módulos completamente nuevos como el Dashboard de trámites, la visualización de documentos y el asistente del formulario DS-160 con integración completa entre frontend y backend. El equipo completó la totalidad de los 105 puntos de historia planificados, lo que demuestra una mejora sustancial en la capacidad de entrega respecto al sprint anterior.

Además, no se registraron cambios de alcance durante el sprint, lo que indica que la planificación inicial fue sólida y bien definida. La implementación de pruebas completas del sistema y la elaboración del reporte y presentación también reflejan una mayor madurez en los procesos del equipo.

Aspectos a mejorar

Se identificó nuevamente que el inicio del desarrollo se concentró principalmente en la segunda mitad del sprint, con muy poca actividad registrada en los primeros días (9–12 de abril). Aunque el equipo logró completar todo el alcance, esta concentración final genera presión innecesaria y reduce el margen para detectar y corregir errores.

También, se observó al menos un caso de retrabajo: la tarea SCRUM-42 (implementación de endpoints para el DS-160) fue marcada como completada, luego reabierta y completada nuevamente, lo que indica que podría mejorarse la definición de criterios de aceptación antes de dar una tarea por terminada.

Acciones a tomar

Para futuros sprints, se propone mantener el nivel de compromiso demostrado en este sprint, pero distribuyendo el trabajo de forma más homogénea desde el primer día. Se recomienda establecer metas intermedias al inicio de la semana (por ejemplo, un porcentaje mínimo de puntos completados a mitad del sprint) para evitar la acumulación de tareas al final.

Se sugiere reforzar los criterios de aceptación durante la planificación para reducir el retrabajo. Por último, se propone usar la velocidad real de 105 puntos como referencia para calibrar la estimación del próximo sprint, tomando en cuenta que este nivel de ejecución requirió un esfuerzo intenso del equipo.

Anexos

Formularios LOGT

Nombre: Diego Quan						
Carné: 24336						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
06/04	20:00	21:00	-	60 min	Backlog	Lista de historias y tareas
11/04	18:00	20:00	10 min	110 min	Desarrollo	Manejo básico de errores de autenticación
11/04	20:15	23:15	15 min	165 min	Desarrollo	Implementación de persistencia de sesión
15/04	19:00	22:00	10 min	170 min	Desarrollo	Implementación de estado simple del trámite
21/04	18:00	21:00	15 min	165 min	Desarrollo	Definición de estructura básica del formulario
21/04	21:15	00:15	15 min	165 min	Desarrollo	Implementación de endpoints para guardar información
22/04	19:00	21:00	10 min	110 min	Cierre	Creación de reporte con métricas de Jira

Nombre: Norman Aguirre						
Carné: 24479						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
06/04	21:00	23:00	-	120 min	Backlog	Creación del Sprint en Jira
11/04	19:00	20:30	20 min (fue al baño)	70 min	Desarrollo	Cambios en el Docker
15/04	20:00	22:00	-	120 min	Desarrollo	Nueva pantalla de Documentos
18/04	18:00	21:00	60 min (fui a comprar comida)	120 min	Desarrollo	Cambios en la pantalla de documentos
18/04	21:00	21:20	-	20 min	Desarrollo	Eliminación pantalla Upload
18/04	22:00	00:00	25 mins (vi tiktok)	95 min	Desarrollo	Creación del EndPoint de Upload
19/04	00:00	02:30	-	150 min	Desarrollo	Visualización de Documentos y validación de tipo de documento
21/04	18:00	19:00	30 mins (estaba en clase)	30 min	Desarrollo	Creación del Servidor

21/04	21:00	22:00	-	60 min	Desarrollo	Subir Proyecto al server y levantarlo con Docker
21/04	22:00	01:00	60 mins (estaba viendo una serie)	120 min	Desarrollo	Cambios de Lecturas de LocalHost al servidor.

Nombre: Diego Guevara						
Carné: 24128						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
19/04	22:00	23:30	15 min (tiktok)	75 min	Desarrollo	Creacion de la tabla "tramite" en init.sql
20/04	00:00	01:00	5 min (ir por comida)	55 min	Desarrollo	Implementacion del endpoint GET/estado del backend/ usando fetch y build apiURL
20/04	01:30	02:30	10 min (ver tiktok)	50 min	Desarrollo	Conexion del Dashboard en app.jsx con el endpoint
21/04	00:15	02:00	15 min (ver el teléfono)	90 min	Desarrollo	Cargar el formulario desde el backend al montar la pagina
21/04	02:20	03:30	10 min (ir por comida)	60 min	Desarrollo	Guardar el progreso del formulario en el backend mediante POST

21/04	23:00	23:59	10 min (ir al baño)	49 min	Desarrollo	Marcar el formulario como completado al finalizar creando la funcion finalizarFORMULARIO
-------	-------	-------	---------------------	--------	------------	--

Nombre: Juan Francisco Orozco Mijangos						
Carné: 24647						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
10/04	17:30	18:30	5 min	55 min	Planificación	Revisión de diseño y planificación de ajustes UI
10/04	18:30	20:00	10 min	80 min	Desarrollo	Ajuste visual básico alineado al diseño (Seleccionar Perfil)
14/04	18:00	19:00	5 min	55 min	Análisis	Revisión de feedback visual necesario (Seleccionar Perfil)
14/04	19:00	21:00	10 min	110 min	Desarrollo	Implementación de feedback visual (Seleccionar Perfil)

17/04	17:30	18:30	5 min	55 min	Análisis	Evaluación de interfaz (Documentos)
21/04	16:30	17:30	10 min	50 min	Diseño	Diseño de estructura de formulario ds160
21/04	17:30	21:00	15 min	195 min	Desarrollo	Desarrollo de interfaz del formulario en React
22/04	17:00	18:00	5 min	55 min	Preparación	Organización de presentación
