

App de Apoyo y Orientación para Solicitantes de Visa

Primer Sprint Scrum



Diego Quan (24336)

Diego Guevara (24128)

Juan Francisco Orozco Mijangos (24647)

Norman Aguirre (24479)

Enlaces importantes

Link con el repositorio donde está alojado el proyecto:

https://github.com/dquan123/Software_Proyecto.git

Link del Jira (De igual forma en la parte de abajo están las evidencias):

<https://uvg-team-somaxnik.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjojMDIyYzBjN2RiZGQyNGI1YzlmZDFmYzE1YWVjZTM3NjYiLCJwIjoiaj9>

Link del documento de trabajo:

<https://1drv.ms/w/c/eb44c651f7b89612/IQAko8lTCr89T61evTFsJ7DOAY6DgCsE24zKxKwalDJ-kJ4>

Product Backlog

El Product Backlog del sistema está conformado por los requisitos funcionales definidos en la fase de análisis, los cuales representan las funcionalidades principales del sistema. Cada elemento del backlog está basado en una historia de usuario previamente identificada y cuenta con un nivel de prioridad según su impacto en el sistema.

Las funcionalidades incluidas en el Product Backlog son las siguientes:

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-01	Registro de usuario	Alta
RF-02	Inicio de sesión	Alta
RF-03	Selección de perfil	Media
RF-04	Visualización del estado del trámite	Alta
RF-05	Visualización de etapas del proceso	Media
RF-06	Completar formulario DS-160	Alta
RF-07	Guardar progreso del formulario	Media
RF-08	Cronología del trámite	Media
RF-09	Carga de documentos	Media
RF-10	Visualización del estado de documentos	Media
RF-11	Clasificación de documentos	Baja
RF-12	Simulación de entrevista	Alta
RF-13	Retroalimentación en simulación	Alta
RF-14	Preparación emocional	Media

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-15	Notificaciones del sistema	Media
RF-16	Priorización de notificaciones	Baja
RF-17	Checklist de tareas pendientes	Media
RF-18	Ejemplos de respuestas en entrevista	Media

Las funcionalidades clasificadas con prioridad Alta corresponden a aquellas necesarias para garantizar el funcionamiento básico del sistema, especialmente las relacionadas con autenticación, simulación y guía del proceso de visa. Las funcionalidades de prioridad Media complementan la experiencia del usuario, mientras que las de prioridad Baja representan mejoras adicionales que pueden desarrollarse en futuros sprints.

Sprint Backlog

El Sprint Backlog está conformado por las historias de usuario seleccionadas para el desarrollo durante el sprint actual. Estas fueron elegidas con base en su prioridad y en el valor que aportan al sistema.

Historia	Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
HU-01	Crear pantalla de registro	Interfaz básica de registro	2h	Quan	07/04
HU-01	Backend registro	Guardar usuario en BD	2h	Quan	07/04
HU-02	Crear login	Interfaz de login	2h	Juanfri	07/04
HU-02	Validación login	Autenticación usuario	2h	Juanfri	07/04
HU-03	Selección de perfil	UI selección perfil	1.5h	Juanfri	07/04
HU-03	Guardar perfil	Lógica guardar perfil	1.5h	Yaya	07/04
HU-04	Dashboard simple	Mostrar estado del trámite	2h	Yaya	08/04
HU-04	Obtener estado	Backend estado usuario	2h	Yaya	08/04
HU-09	Pantalla documentos	UI básica documentos	2h	Norman	08/04
HU-09	Backend documentos	Guardar/listar documentos	2h	Norman	08/04
General	Setup proyecto	React + Node + BD	2h	Norman	07/04
General	Conexión BD	Conectar PostgreSQL	2h	Norman	07/04
General	API base	Endpoints básicos	2h	Norman	08/04

Historia	Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
General	Integración frontend-backend	Conectar vistas con API	3h	Norman	08/04
General	Planificación sprint	Organización backlog	2h	Quan	06/04
General	Métricas sprint	Burndown velocidad +	2h	Quan	08/04
General	Retrospectiva	Análisis del sprint	2h	Quan	08/04

Evidencia del flujo en Jira

Espacio

Visa Sprint 1

...

Resumen

Backlog

Tablero

Código

+

Buscar ta...

...

...

Filtro

Completar sprint

Grupo

...

TO DO 6

HU-01 Registro

8 abr 2026

SCRUM-1

2

...

...

HU-02 Login

8 abr 2026

SCRUM-3

2

...

...

HU-03 Selección de perfil

8 abr 2026

IN PROGRESS 1

Gestión

8 abr 2026

SCRUM-18

3

...

...

IN REVIEW

DONE

Espacio

Visa Sprint 1

...

Resumen

Backlog

Tablero

Código

+

Buscar ta...

...

...

Filtro

Completar sprint

Grupo

...

TO DO 6

HU-01 Registro

8 abr 2026

SCRUM-1

2

...

...

HU-02 Login

8 abr 2026

SCRUM-3

2

...

...

HU-03 Selección de perfil

IN PROGRESS 1

Gestión

8 abr 2026

SCRUM-18

3

...

...

IN REVIEW

Actividad de Jira

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

0 % completado

Actividad	P...	P...	Estado
SCRUM-23	Pla	ni...	TAREAS I
SCRUM-24	Mét	rí...	TAREAS I
SCRUM-25	Ret	ro...	TAREAS I

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

🔍 Search

+ Crear

💎 Ver los planes

Preguntar a Rovo

🔔

🔄

⚙️

👤

Espacio

📄 Visa Sprint 1

...

🌐 Resumen

📅 Backlog

📊 Tablero

📄 Código

+

Completar sprint

🔔

Grupo ▾

📄

🔄

...

🔍 Buscar ta...

👤

🔍

Filtro

TO DO 6

HU-01 Registro

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-1

2

👤

🔍

👤

HU-02 Login

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-3

2

👤

🔍

👤

HU-03 Selección de perfil

IN PROGRESS 1

Gestión

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-18

3

👤

🔍

👤

IN REVIEW

Actividad de Jira

🔗

🔗

✕

SCRUM-18 /

SCRUM-23

👁️ 1

🔗

...

Planificación Sprint

+

...

Finalizada ▾

✓ Listo

⚡

⚙️ Mejorar el tipo de actividad Subtask

Descripción

Editar descripción

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

▾ Detalles

⚙️

Espacio

📄 Visa Sprint 1

...

🌐 Resumen

📅 Backlog

📊 Tablero

📄 Código

+

Completar sprint

🔔

Grupo ▾

📄

🔄

...

🔍 Buscar ta...

👤

🔍

Filtro

TO DO 1

HU-04 Estado del trámite

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-5

2

👤

🔍

👤

+ Crear

IN PROGRESS 4

HU-02 Login

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-3

2

👤

🔍

👤

HU-03 Selección de perfil

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-4

2

👤

🔍

👤

Gestión

📅 8 abr 2026

IN REVIEW 2

General

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-17

3

👤

🔍

👤

HU-01 Registro

📅 8 abr 2026

✓ SCRUM-1

2

👤

🔍

👤

DONE 2

Espacio



Visa Sprint 1



...



Resumen



Backlog



Ta



Código




+

Q Buscar en...



Terminar el 8/4



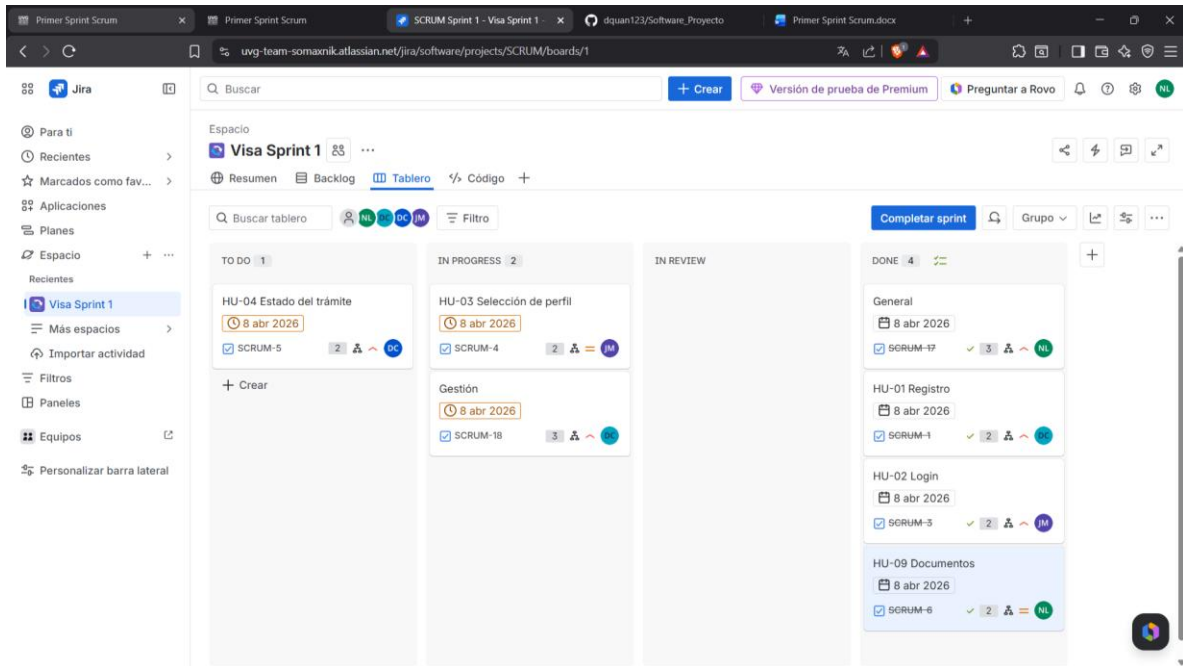

Retrospective: SCRUM Sprint 1

 De DIEGO ALEJANDRO QUAN CASTILLO  Ver visualizaciones  Añade una reacción

 Reflexiona sobre trabajos anteriores e identifica oportunidades de mejora siguiendo las instrucciones de la [estrategia de retrospectiva](#).

Espacio

 **Visa Sprint 1**  ...



 **Resumen**  Backlog  Tablero  Código +



24 finalizadas
en los últimos 7 días



24 actualizadas
en los últimos 7 días



24 creadas
en los últimos 7 días



0 vencen pronto
en los próximos 7 días


Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades. [Ver todas las actividades](#)



■ Done: 24

Imágenes en Postman para mostrar que funciona el Backend

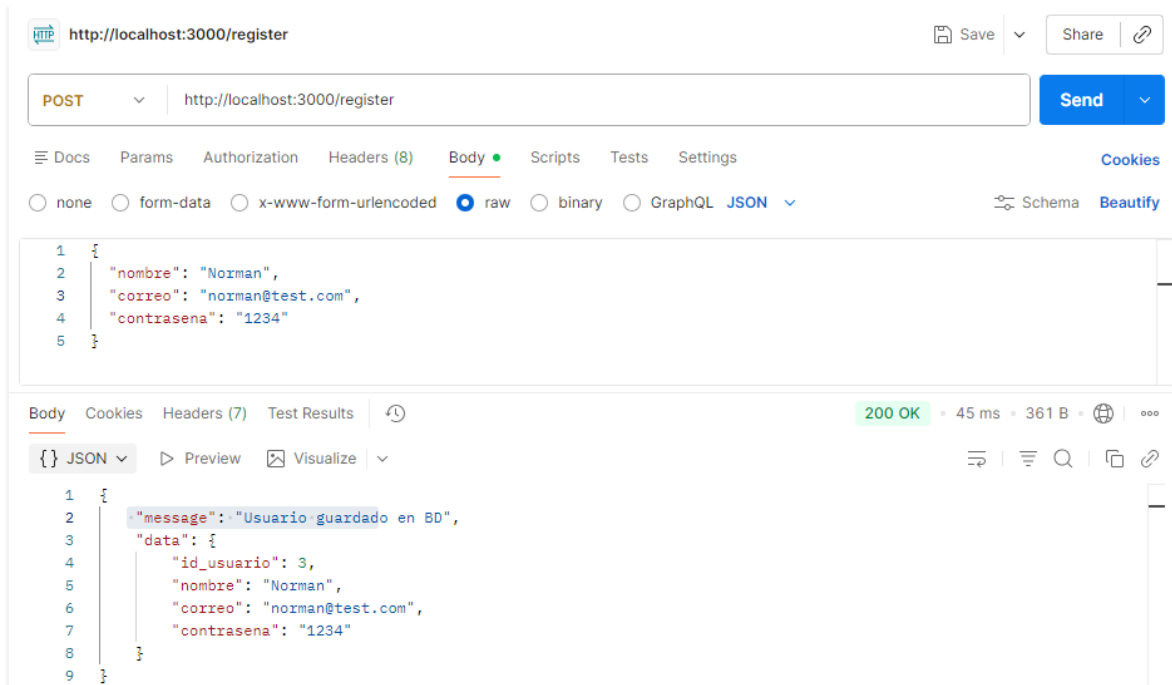


Postman interface showing a successful POST request to `http://localhost:3000/register`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "nombre": "Norman",
3   "correo": "norman@test.com",
4   "contrasena": "1234"
5 }
```

The response is a **200 OK** status with a response time of 45 ms and a body size of 361 B. The response body is a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "message": "Usuario guardado en BD",
3   "data": {
4     "id_usuario": 3,
5     "nombre": "Norman",
6     "correo": "norman@test.com",
7     "contrasena": "1234"
8   }
9 }
```

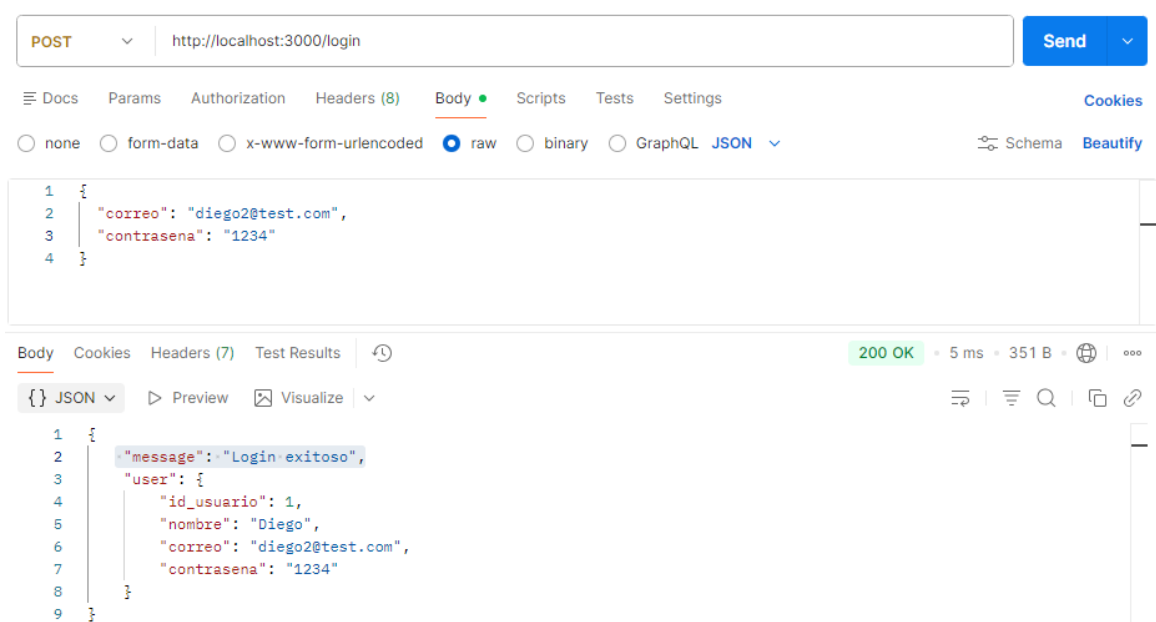

Postman interface showing a successful POST request to `http://localhost:3000/login`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "correo": "diego2@test.com",
3   "contrasena": "1234"
4 }
```

The response is a **200 OK** status with a response time of 5 ms and a body size of 351 B. The response body is a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "message": "Login exitoso",
3   "user": {
4     "id_usuario": 1,
5     "nombre": "Diego",
6     "correo": "diego2@test.com",
7     "contrasena": "1234"
8   }
9 }
```

```
visa_db=# select * from usuario;
```

id_usuario	nombre	correo	contrasena
1	alejandro	alejandro@test.com	1234
2	Diego	diego2@test.com	1234
5	Alejandro	alejandro2@test.com	1234
7	Norman	norman2@test.com	1234
8	Rene	rene@test.com	1234

```
(5 rows)
```

Puntos del sprint

Durante la planificación del sprint se estimaron las tareas utilizando puntos de historia con base en su complejidad relativa. Las tareas principales del sprint incluyeron el desarrollo del registro de usuarios, autenticación (login), configuración del entorno (Docker y base de datos) e integración completa entre frontend, backend y base de datos.

A partir de esta estimación, el sprint tuvo un total de 20 puntos de historia.

Al finalizar el sprint, el equipo logró completar la totalidad de las tareas planificadas, alcanzando los 20 puntos de historia completados, lo que indica un cumplimiento total del alcance definido para el sprint.

Uso de Jira

Durante el desarrollo del sprint se utilizó Jira como herramienta de gestión para organizar y dar seguimiento a las tareas del equipo.

El sprint fue iniciado, respetando el calendario establecido para el proyecto (a pesar de ser poco tiempo el que tuvimos respetamos las dos fechas para trabajar). Las tareas fueron definidas previamente en la reunión de planificación, por lo que no se añadieron nuevas tareas una vez iniciado el sprint, evidenciando una planificación adecuada.

A lo largo del sprint se mantuvo un flujo de trabajo consistente dentro del tablero, donde las tareas pasaron progresivamente por los estados To Do, In Progress y Done, reflejando el avance real del equipo.



Además, existe coherencia entre las tareas marcadas como completadas en Jira y el incremento del sistema presentado, ya que las funcionalidades implementadas (registro y autenticación de usuarios) pueden observarse funcionando en el sistema desarrollado y en las capturas anteriores.


VisaGuide

Te acompañamos en cada paso de tu proceso de visa.

Registrarse


Iniciar sesión

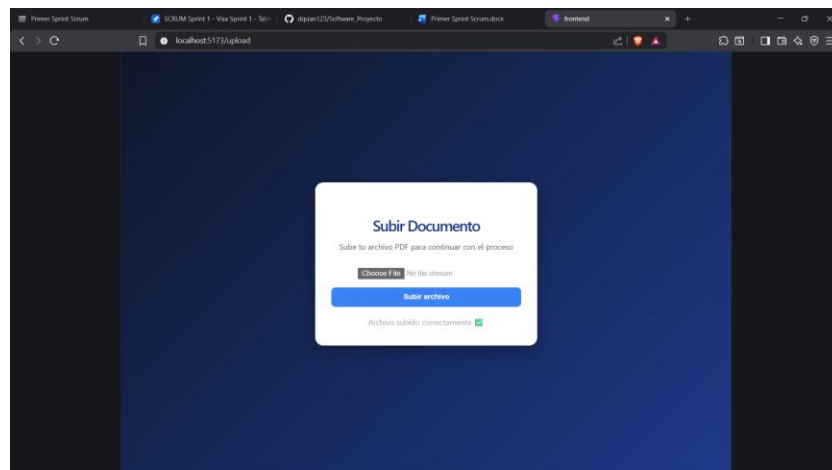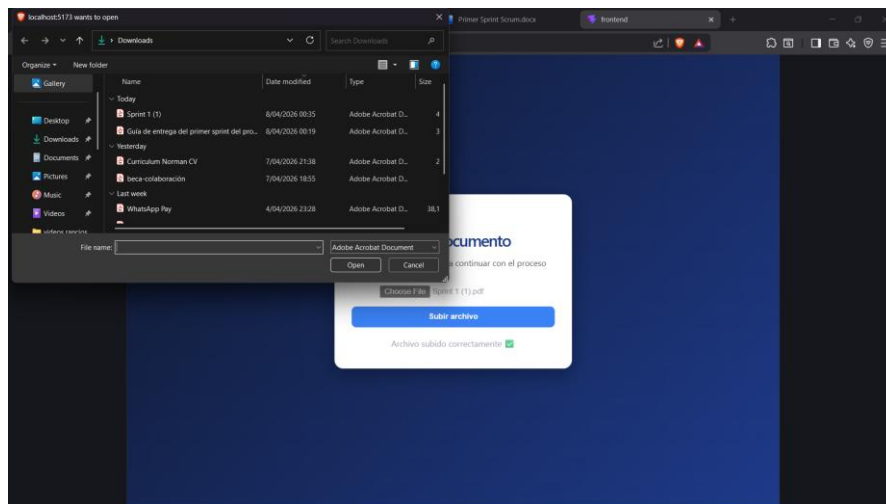

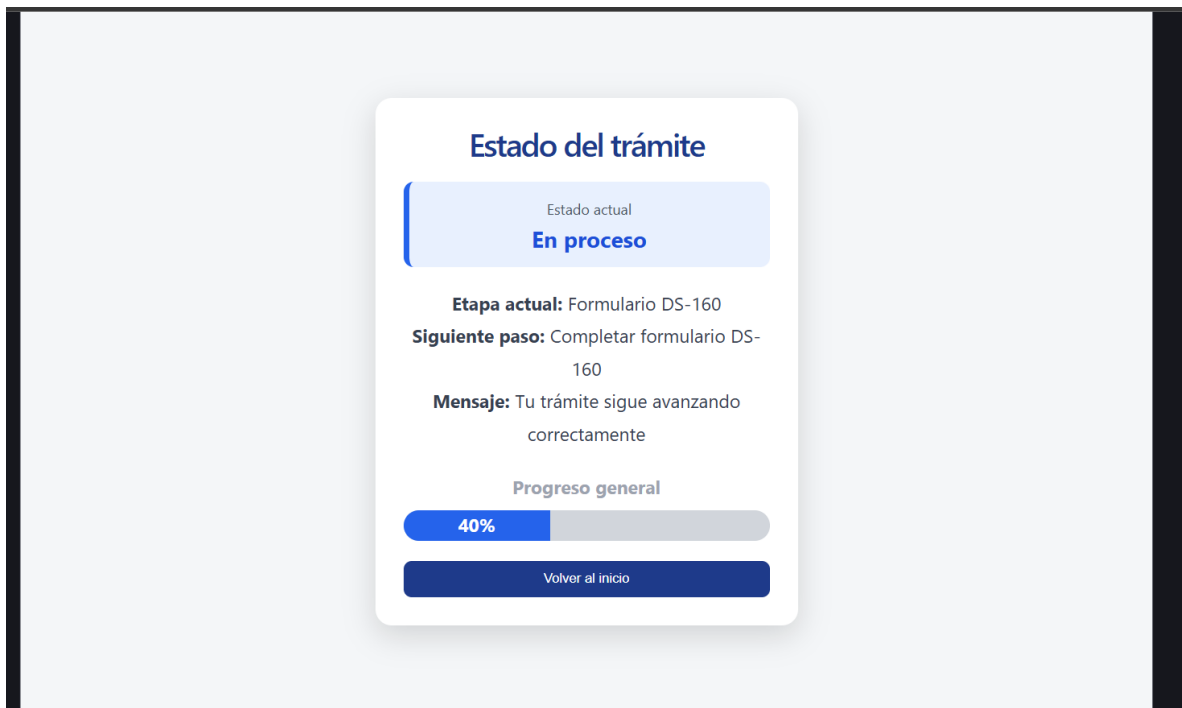

Burndown

El gráfico burndown muestra la evolución del trabajo pendiente durante el sprint. Al inicio del sprint se estimó un total de aproximadamente 20 puntos de historia, los cuales fueron disminuyendo progresivamente conforme se completaban las tareas.

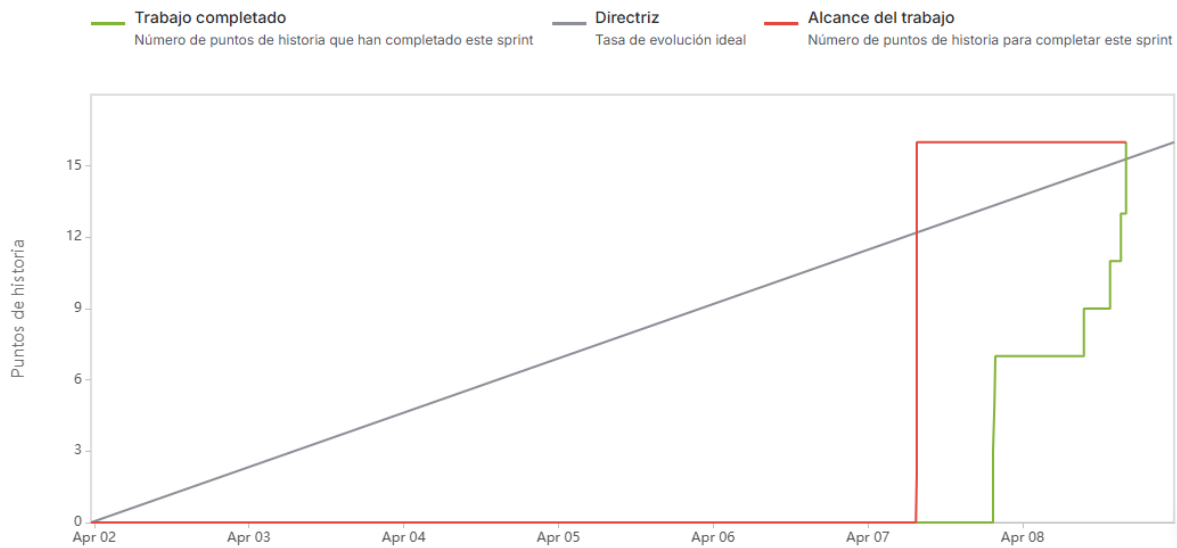

Interpretación:

El gráfico burndown evidencia que el trabajo no se realizó de manera uniforme a lo largo del sprint, sino que se concentró principalmente en la fase final. Esto indica que el equipo inició el desarrollo más tarde de lo planificado, lo que generó una acumulación de trabajo pendiente.

Sin embargo, también se observa una rápida ejecución en los últimos días, lo que permitió avanzar significativamente y completar la mayor parte de las tareas críticas.

Este comportamiento refleja que, aunque la planificación inicial no se siguió completamente en cuanto a tiempos, el equipo fue capaz de adaptarse y cumplir con los objetivos principales del sprint bajo presión.

Velocidad del sprint

La velocidad del sprint corresponde a la cantidad de puntos de historia completados durante el periodo. En este sprint, el equipo logró completar aproximadamente 16 puntos de historia.

Aunque no se alcanzó el total estimado inicialmente, la cantidad de trabajo completado es considerable tomando en cuenta que el desarrollo se concentró en un periodo corto de tiempo.

La velocidad obtenida proporciona una referencia realista para la planificación de futuros sprints, especialmente considerando la capacidad del equipo en condiciones de tiempo limitado.



Retrospectiva

Aspectos positivos

Durante el sprint se lograron avances significativos en el desarrollo del sistema, destacando la correcta integración entre frontend, backend y base de datos. El equipo logró implementar funcionalidades clave como el registro y autenticación de usuarios, cumpliendo con el objetivo principal del sprint.

Asimismo, se logró establecer un entorno funcional utilizando Docker, lo cual permitió centralizar la ejecución del sistema y facilitar la integración de los distintos componentes.

Además, el equipo demostró una alta capacidad de adaptación, logrando avanzar rápidamente en las últimas etapas del sprint y resolviendo problemas técnicos complejos en un periodo corto de tiempo.

Aspectos a mejorar

Se identificó que el inicio del desarrollo del sprint se retrasó, lo cual provocó que la mayor parte del trabajo se concentrara en los últimos días. Esto generó una carga de trabajo intensa y redujo el tiempo disponible para iteraciones y mejoras.

También se presentaron dificultades técnicas relacionadas con la configuración del entorno (Docker y base de datos), lo cual consumió más tiempo del esperado al inicio.

Además, algunas tareas no fueron iniciadas de manera temprana, lo que evidencia la necesidad de una mejor distribución del trabajo desde el comienzo del sprint.

Acciones a tomar

Para futuros sprints, se propone iniciar el desarrollo desde las primeras etapas del sprint, evitando la acumulación de trabajo al final.

Se recomienda realizar una validación previa del entorno técnico antes de comenzar el desarrollo, con el fin de reducir el tiempo invertido en la resolución de problemas de configuración.

Además, se sugiere distribuir las tareas de manera más equilibrada entre los integrantes del equipo y fomentar un avance progresivo durante todo el sprint.

Por último, se propone utilizar la velocidad real del sprint como referencia para mejorar la estimación de tareas en futuras iteraciones.

Anexos

Formularios LOGT

Nombre: Diego Quan						
Carné: 24336						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
06/04	20:00	21:00	-	60 min	Backlog	Lista de historias y tareas
07/04	7:00	8:00	-	60 min	Pila del sprint	Organización y distribución de tareas en Jira
08/04	8:00	9:30	10 min (teléfono)	80 min	Incremento funcional	Conexión de BD, Frontend y Backend
08/04	14:00	16:00	30 min (almuerzo)	90 min	Incremento funcional	Login y registro (lógica backend y frontend)
08/04					Resultados	Métricas, gráficas y retrospectiva del sprint con Jira

Nombre: Norman Aguirre						
Carné: 24479						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
07/04	21:00	22:00	-	60 mins	Documentos	Creación de entorno para trabajar documentos
08/04	23:00	03:00	100 mins (explicandole a Diego Guevara usar Jira y el flujo de trabajo)	140 mins	Documentos	Implementación de la pantalla y flujo fácil para guardar archivos.
08/04	09:00	09:30	-	30 mins	Documentos	Colocar archivos, evidencia en reporte

Nombre: Diego Guevara						
Carné: 24128						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
07/04	11:00	12:30	15 min (comer)	75 min	DesarrolloBackend	Se agregó el endpoint /estado-tramite para devolver el estado actual del trámite
08/04	13:00	14:30	10min (café)	80 min	DesarrolloFrontend	Se agregó una ruta nueva para acceder al dashboard desde la aplicación.
08/04	15:00	16:30	5 min (llamada)	85 min	entregable	Se agregaron al documento de Word las evidencias del funcionamiento del backend y del dashboard.

Nombre: Juan Francisco Orozco Mijangos						
Carné: 24647						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
07/04/2026	09:40	10:10	5 min	25 min	Configuración	Instalación de dependencias del frontend con npm install
07/04/2026	10:10	11:00	10 min	40 min	Desarrollo	Creación del componente ProfileSelection en React
07/04/2026	11:00	11:40	10 min	30 min	Desarrollo	Implementación de estilos en ProfileSelection.css
07/04/2026	11:40	12:10	5 min	25 min	Desarrollo	Integración de ruta /perfil en App.jsx
08/04/2026	10:00	10:30	5 min	25 min	Desarrollo	Implementación de lógica de selección de perfil
08/04/2026	10:30	11:10	10 min	30 min	Backend	Creación de endpoint /guardar-perfil en Express
